



COMUNE DI S. AGATA MILITELLO
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale
Area "Strategia e Sviluppo Territoriale"

***1° STRALCIO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO
STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO EX ONMI DA DESTINARE
A UFFICI DI GIUSTIZIA - UFFICIO GIUDICE DI PACE.***

Redatto dall'U.T.C.:

Unità di Progetto:

Ing. Salvatore Monteleone

Consulenti strutturali:

Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi

Ing. Antonio Pio D'Arrigo

La Direzione Lavori:

Ing. Agostino La Rosa

_____ (visto)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Luigi Rundo

Tavola

I

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaboraz. Progetto: Giugno 2014

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5	5	27/10/2014	31/10/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	3	3	27/10/2014	29/10/2014
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	3	3	27/10/2014	29/10/2014
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	3	3	27/10/2014	29/10/2014
Demolizioni tramezzi						
Demolizione di pareti divisorie	1	1	10	12	03/11/2014	14/11/2014
Rimozione pavimenti e rivestimenti interni						
Rimozione di pavimenti interni	1	1	10	12	03/11/2014	14/11/2014
Rimozione rivestimenti interni	1	1	10	12	03/11/2014	14/11/2014
Disfacimenti e rimozioni						
Rimozione di impianti	1	2	7	9	17/11/2014	25/11/2014
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	1	7	9	17/11/2014	25/11/2014
Rimozione di serramenti interni	1	1	7	9	17/11/2014	25/11/2014
Rimozione di serramenti esterni	1	1	7	9	17/11/2014	25/11/2014
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne	1	1	7	9	17/11/2014	25/11/2014
Realizzazione tramezzi						
Realizzazione di divisorio interni	1	1	10	12	24/11/2014	05/12/2014
Interventi di consolidamento delle strutture						
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Consolidamento strutture di fondazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Realizzazione di murature esterne	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	1	50	77	04/12/2014	18/02/2015
Impianti						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	2	30	42	19/02/2015	01/04/2015
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	2	30	42	19/02/2015	01/04/2015
Rifacimento Intonaci						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	1	49	72	02/04/2015	12/06/2015
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	1	49	72	02/04/2015	12/06/2015
Pavimenti e rivestimenti						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	1	15	19	15/06/2015	03/07/2015
Posa di pavimenti per interni	1	1	15	19	15/06/2015	03/07/2015
Posa di rivestimenti interni	1	1	15	19	15/06/2015	03/07/2015

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione Controsoffitto						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	1	15	19	06/07/2015	24/07/2015
Tinteggiature						
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	30	40	27/07/2015	04/09/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	1	1	30	40	27/07/2015	04/09/2015
Sostituzione Infissi e Porte						
Posa di serramenti interni	1	1	20	26	07/09/2015	02/10/2015
Posa di serramenti esterni	1	1	20	26	07/09/2015	02/10/2015
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	17	23	01/10/2015	23/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = AREA cantiere
- 2) = AREA Scavo
- 3) = AREA Fabbricato

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


- 1) = Impresa Edile
- 2) = Impresa Impiantistica

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Ott 2014 - Dic 2014			Gen 2015 - Mar 2015		
		Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
Allestimento del cantiere	5 g						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1 5					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1 3					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1 3					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g	Z1 3					
Demolizioni tramezzi	10 g						
Demolizione di pareti divisorie	10 g	Z1 10					
Rimozione pavimenti e rivestimenti interni	10 g						
Rimozione di pavimenti interni	10 g	Z1 10					
Rimozione rivestimenti interni	10 g	Z1 10					
Disfacimenti e rimozioni	7 g						
Rimozione di impianti	7 g	Z1 7					
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	7 g	Z1 7					
Rimozione di serramenti interni	7 g	Z1 7					
Rimozione di serramenti esterni	7 g	Z1 7					
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne	7 g	Z1 7					
Realizzazione tramezzi	10 g						
Realizzazione di divisori interni	10 g	Z1 10					
Interventi di consolidamento delle strutture	50 g						
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	50 g	Z1 50					
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione	50 g	Z1 50					
Consolidamento strutture di fondazione	50 g	Z1 50					
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento muri	50 g	Z1 50					
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	50 g	Z1 50					
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione	50 g	Z1 50					
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	50 g	Z1 50					
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione	50 g	Z1 50					
Realizzazione di murature esterne	50 g	Z1 50					
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	50 g	Z1 50					
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	50 g	Z1 50					
Impianti	30 g						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	30 g				Z1 30		
Realizzazione di impianto elettrico interno	30 g				Z1 30		
Rifacimento Intonaci	49 g						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	49 g						Z1
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	49 g						Z1
Pavimenti e rivestimenti	15 g						
Formazione di massetto per pavimenti interni	15 g						
Posa di pavimenti per interni	15 g						
Posa di rivestimenti interni	15 g						
Realizzazione Controsoffitto	15 g						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	15 g						
Tinteggiature	30 g						
Tinteggiatura di superfici interne	30 g						
Tinteggiatura di superfici esterne	30 g						

[illegible]

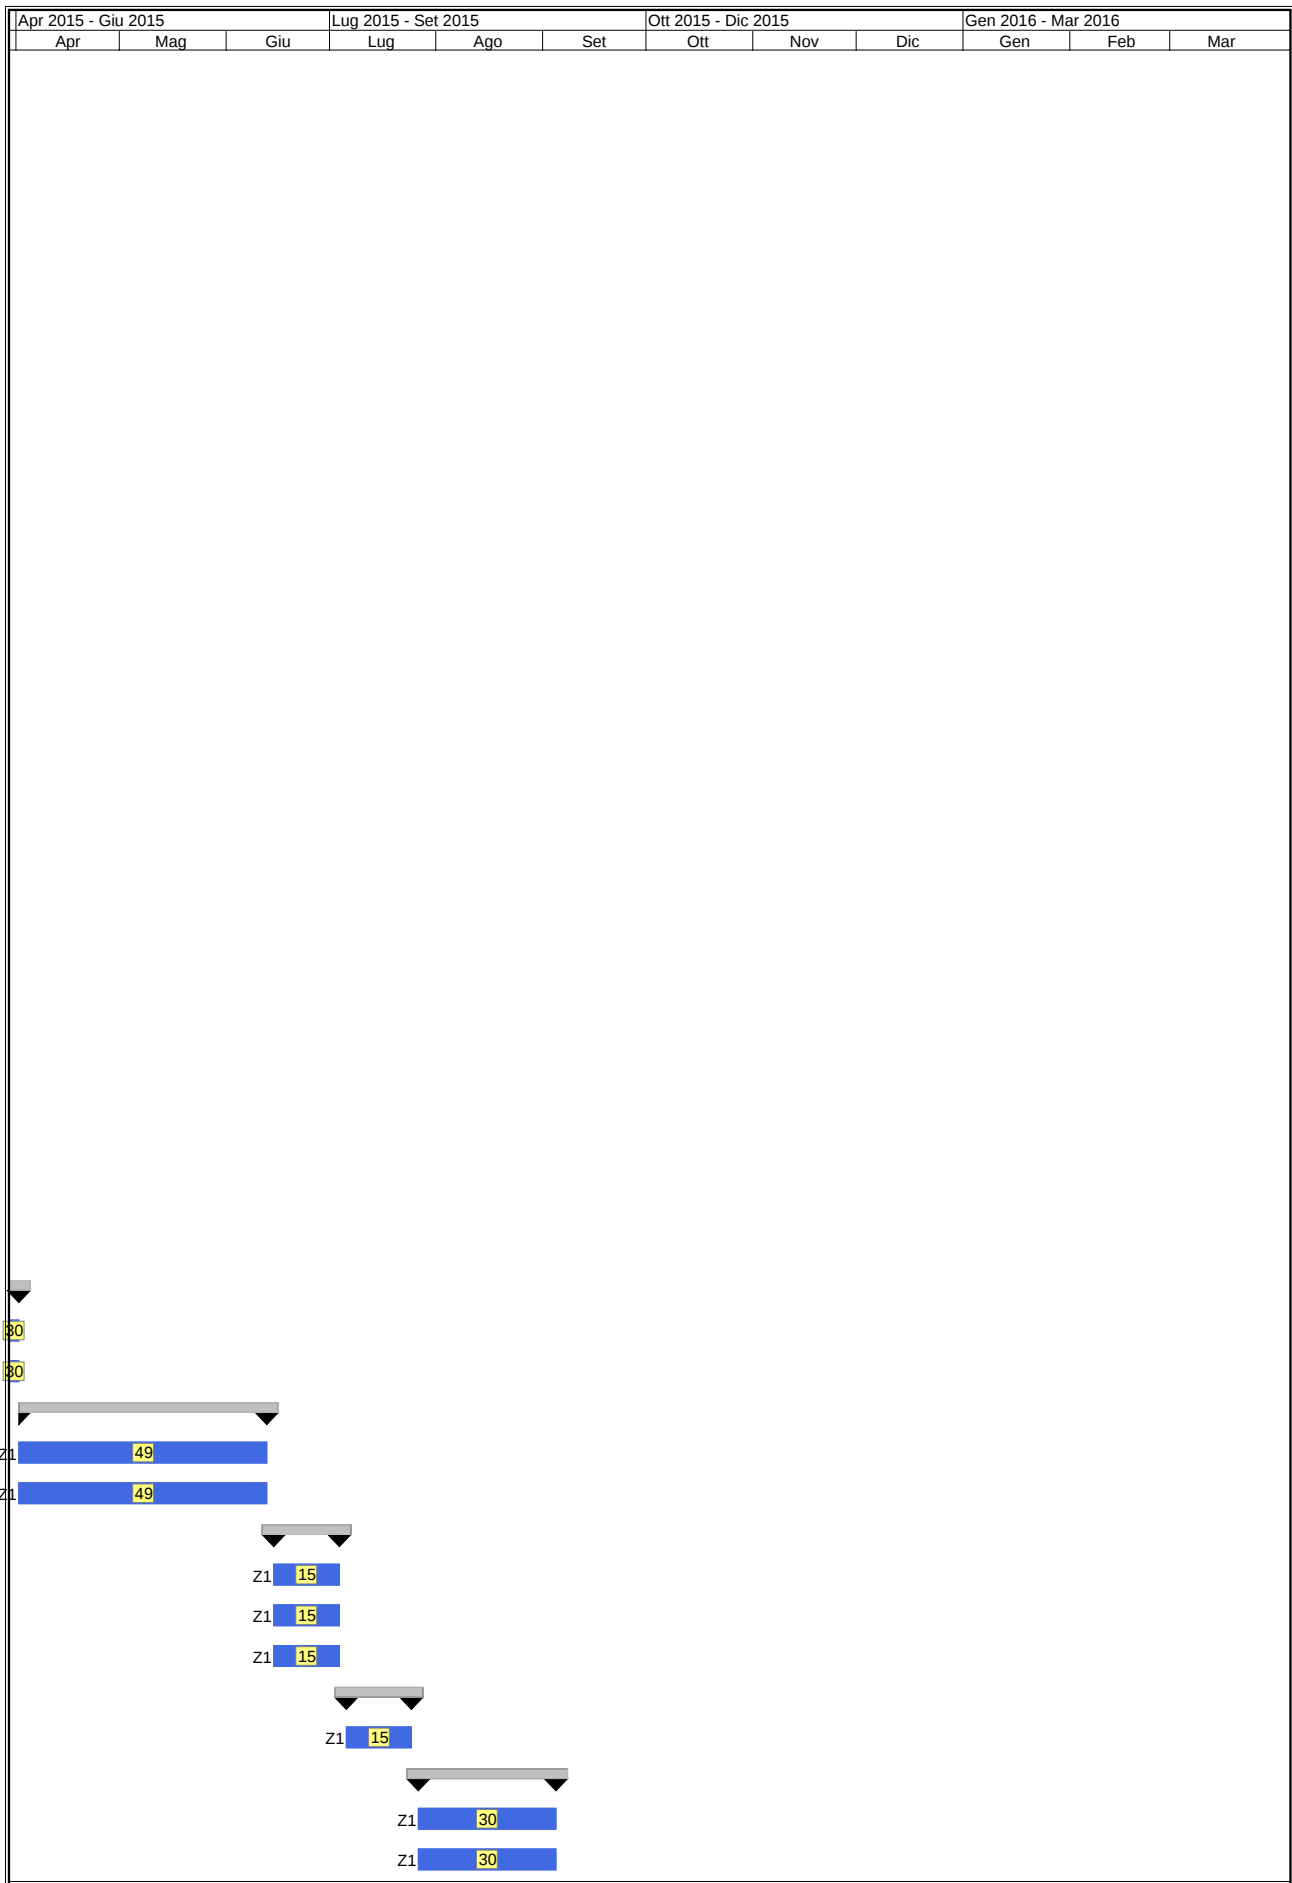

Apr 2015 - Giu 2015			Lug 2015 - Set 2015			Ott 2015 - Dic 2015			Gen 2016 - Mar 2016		
Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
Z1 20 Z1 20 Z1 17											
